

Ofício Nº 149/2020

Riacho da Cruz (RN), em 09 de Dezembro de 2020.

REFERENTE:

GESTOR: MINISTÉRIO DO TURISMO.

PROGRAMA: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO.

CONTRATO DE REPASSE: 1.056.612-15/2018

CONVENIO Nº: 869.883/2018

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 2.ª VISTORIA E MEDIÇÃO.

Senhor Gerente,

Após cumprida a **Segunda Etapa** do cronograma das obras, em implantação pelo programa Cultura: Preservação, Promoção E Acesso, através de Contrato de Repasse acima descrito, vimos solicitar a **segunda vistoria e medição** e o respectivo pagamento.

Para tanto, anexamos o mapa da **segunda medição**, que totaliza a execução no montante de **R\$ 28.835,17** (Vinte e Oito mil, Oitocentos e Trinta e Cinco reais e Dezessete centavos) a ser custeado pelas fontes Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/Ministério do Turismo/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO.

Aproveitamos o ensejo, para renovarmos protestos de estima e consideração, ficando à disposição de quaisquer outras providências que viabilizem a conclusão do pleito.

Atenciosamente,



.....
MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Ilmo. Senhor.

SILVIO JOSÉ CONCEIÇÃO.

GIGOV/NA-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

NATAL - RN

Riacho da Cruz (RN), em 09 de Dezembro de 2020.

À
Caixa Econômica Federal
GIGOV - NAT - NATAL/RN



REFERENTE:
GESTOR: MINISTÉRIO DO TURISMO.
PROGRAMA: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ - RN.

Senhor Superintendente/Gerente

1 Vimos, pelo presente, solicitar a essa Caixa Econômica Federal, autorizar o Saque de recursos do(s) contrato(s) sob referência, no valor abaixo discriminado:

Contrato de Repasse	Município	Valor repasse (R\$)	Valor contrapartida	
			Financeira R\$	Serviços R\$ (*)
1.056.612-15/2018	Riacho da Cruz	28.835,17	0,00	-

(*) Para contrapartida em serviços

2 Para tanto, encaminhamos a Seguinte Documentação:

- ◆ Relatório fotográfico da 2.ª Medição;
- ◆ Relatório de execução físico-financeira;
- ◆ Relação de Solicitação/Comprovação de Pagamentos – OGU;
- ◆ Relatório Resumo de Empreendimento;
- ◆ PLE (PLE e resumo);

Atenciosamente,





MARIA BERNADETE NUNES RÉGO GOMES
Prefeita Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

Contratado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	CONTRATO DE REPASSE N. 1.056.612-15/2018 PROGRAMA: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO. PERÍODO DE EXECUÇÃO 27/06/2020 A 08/12/2020
--	---

Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade	Físico			
				No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
01	01	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	M2	16,95%	14,07%	44,89%	18,61%
Total				16,95%	14,07%	44,89%	18,61%

Financeiro									
Meta	Etapa/Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Repasse	Contra-Partida	Outros	Total	Repasse	Contra-Partida	Outros	Total
1	1.1	28.835,17	0,00	-	28.835,17	38.159,88	0,00	-	38.159,88
Total		28.835,17	0,00	-	28.835,17	38.159,88	0,00	-	38.159,88

Nome/Assinatura do contratado/Interveniente executor  MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES Prefeita Municipal	Nome/Assinatura do responsável pela execução do projeto  MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES Prefeita Municipal
---	--



Prefeitura Municipal de
Riacho da Cruz
Um Brasil Melhor!



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ



EDIÇÃO 2009-2012

Relação de Solicitação/ Comprovação de Pagamentos – OGU

Contrato Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN		Contrato de Repasse N.º 1.056.612-15/2018 Programa: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO.	
--	--	--	--

Descrição do documento							Quitação do título					
Rec	Item	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Ident	Data	Tít. Créd.	Nº do título de crédito	Nº de série ou Nº identificação	Valor	Data da Quitação	CH/OB
1	1	CERES CONSTRUÇÕES LTDA	10.632.220/0001-91	44.40.41	2	26/06/2020	NOTA FISCAL	000471	-	9.324,71	14/07/2020	OBTV
1	2	CERES CONSTRUÇÕES LTDA	10.632.220/0001-91	44.40.41	2	09/12/2020	FAT	S/N	-	28.835,17	-	-

Total	38.159,88
--------------	------------------

Legenda:

Rec: 1 – OGU; 2 – Contrapartida; 3 – Outros

Ident.: 1 – Trabalho Social; 2 – Obras; 3 – Bens/Serviços; 4 – Máquinas/Equipamentos.

Declaração do Contratado ou representante legal sob as penas da lei

a) Os documentos discriminados nesta Relação de Solicitação/Comprovação de Pagamentos – OGU são pertinentes ao empreendimento, objeto do contrato nele referido, e atestamos que guardam inteira compatibilidade com as medições de obras e serviços executados, materiais, equipamentos e bens e serviços adquiridos, com a execução do trabalho social e com os preços contratuais.

b) Foram observados os aspectos legais pertinentes, no que diz respeito às licitações e contratos de execução e fornecimento formalizados, decorrentes das obras e serviços realizados, materiais, equipamentos e bens adquiridos e execução do trabalho social com os recursos financeiros oriundos do presente contrato de repasse.

c) Assumimos, perante o Agente Operador, a integral responsabilidade técnica pela qualidade das obras, serviços executados, bens adquiridos e do trabalho social realizado.

d) Responsabilizamo-nos pela veracidade dos documentos integrantes nesta relação, bem como pela guarda dos mesmos, mantidos arquivados em pasta própria e em boa ordem no setor de contabilidade, para fins de atendimento aos aspectos legais e aqueles estabelecidos pela CAIXA, inclusive para disponibilização aos Órgãos de Controle Interno e Externo.

e) Apresentaremos, com os elementos que integrarão o próximo pedido de solicitação de recursos, a identificação dos pagamentos realizados constantes desta Relação de Solicitação/Comprovação de Pagamentos.

Riacho da Cruz/RN, 09 de Dezembro de 2020.


MARIA BERNADETE NUNES RÉGIO GOMES
Prefeita Municipal



Avenida Camila de Lélis, 285 – Centro – Riacho da Cruz/RN – CEP 59.820-000 – CNPJ. 08.153.454/0001-04

Site: www.riachodacruzembraos.blogspot.com.br - E-mail: pmriachodacruz@gmail.com - Fone: (84) 3374-0002

Nº OPERAÇÃO 1056.612-15/2018	Nº SICONV 036884/2018	GIGOV NA - NATAL	GESTOR MTURISMO	PROGRAMA TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA 29/06/2018
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	MUNICÍPIO / UF RIACHO DA CRUZ/RN	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA	OBJETO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ-RN - 1ª ETAPA			
Nº CTEF 310100012020	EMPRESA EXECUTORA CERES CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 10.632.220/0001-61	OBJETO DO CTEF EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	INÍCIO DA OBRA 02/03/2020		

% Realizado Acum.: **18,61%** Período: **27/06/2020 a 08/12/2020** Medição: **02**

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
UNICA - CONSTRUÇÃO																																																	

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
2	MOVIMENTO DE TERRA
3	FUNDAÇÕES - ALVENARIA
4	FUNDAÇÕES - BOWL
5	ALVENARIA
6	REVESTIMENTO DE PAREDE
7	REVESTIMENTO DE PISO - ETA
8	REVESTIMENTO DE PISO - ETA
9	REVESTIMENTO DE PISO - ETA

Medições	Datas das medições																										
	26/06/2020	08/12/2020		Medição 01		Medição 02		Medição 03		Medição 04		Medição 05		Medição 06		Medição 07		Medição 08		Medição 09		Medição 10		Medição 11		Medição 12	
%	4,55%	14,07%																									
R\$	9.324,71	28.835,17																									
Acumulado	R\$ 9.324,71	R\$ 38.159,88																									

RIACHO DA CRUZ/RN, 08 de dezembro de 2020
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal: ZILTON PEDRO MENEZES MARINHO
CREA / RJ: 211554678
CART. ANT. RN2020032267






PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1056.612-15/2018	Nº SICONV 036894/2018	IGIOV NA - NATAL	GESTOR MURISHO	PROGRAMA TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA 29/06/2018
PROFONTE / TOMADOR MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	MUNICIPIO / UF RIACHO DA CRUZ/RN	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA	OBJETO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ-RN - 1ª ETAPA			
Nº CTEF 31010001/2020	EMPRESA EXECUTORA CERES CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 10.632.220/0001-91	OBJETO DO CTEF EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN			

ACOMPANHAMENTO

Valor de Investimento: R\$ 205.000,05

METAS

N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R\$)		Acumulado	% Global		Prazo Decorrido (dias)	% Global Previsto	Equivalente dias-obra	Dias Atraso Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.	# Meta	Valores Medidos Acum. (R\$)
		No Período			No Período	Acumulado							
1	26/06/2020	9.324,71		9.324,71	4,55%	86,53%	116	86,53%	5	-111	-72,55%	1	38.159,88
2	08/12/2020	28.835,17		38.159,88	14,07%	100,00%	281	100,00%	32	-249	-162,75%	2	-
3												3	-
4												4	-
5												5	-
6												6	-
7												7	-
8												8	-
9												9	-
10												10	-
11												11	-
12												12	-
13												13	-
14												14	-
15												15	-
16												16	-
17												17	-
18												18	-
19												19	-
20												20	-

Total Medido Acumulado	R\$ 38.159,88	16,61%	Dias Adiant. / Atraso:	-249	-162,75%
-------------------------------	----------------------	---------------	-------------------------------	-------------	-----------------

RIACHO DA CRUZ/RN, 08 de dezembro de 2020
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal: ZILTON PEDRO MENEZES MARINHO
CREA / CAU: 2115546768
ART: RN20200322267

ART: RN20200322267



Responda antes de começar a preencher.

A participação do repasse/financiamento e da contrapartida é igual/proportional em todos os itens de investimento ou pelas componentes do QCI?

SIM NÃO (NUNCA ELIMINE OU APAGUE A PRIMEIRA LINHA OU A PRIMEIRA COLUNA, QUE ESTÃO OCULTAS! ELAS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A EXECUÇÃO DAS MACROS DESTES FORMULÁRIOS)

Relatório Resumo de Empreendimento

RRE	Nº	002	#001
Data emissão		08/12/2020	
Referência (Mês/Ano)		dez/2020	
Nº do CTEF	BM	Item	Fotos (RAE Nº)
1.056.612-15/2018	1		
1.056.612-15/2018	2		
Tomador			
PREF. MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ			
Agente Operador - Repasse			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Fonte de Recursos			
<input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS			
Outras fontes			
Contrapartida			
RRE - Tomador		RRE - Programa	
CT - Valores (R\$)		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO	
Investimento		CT - Modalidade	
229.999,90		CONTRATO DE REPASSE	
Repasse		CT - Objeto	
285.000,05		EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	

Item	Descrição	Valores previstos no QCI (**)		Licitados		Realizado no período (R\$)				Acumulado realizado incluindo o período			
		%	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Repasse(R\$)	CP (R\$)	VI (R\$)	Repasse(R\$)	CP (R\$)	VI (R\$)	% Físico	% Finance
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,40	3.231,17	3.048,43	182,74	-	-	-	3.048,43	-	3.048,43	100,00	94,34
Subtotal 1		1,40	3.231,17	3.048,43	182,74	-	-	-	3.048,43	-	3.048,43	100,00	94,34
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,73	6.276,71	6.276,28	2,43	-	-	-	6.276,28	-	6.276,28	100,00	99,86
Subtotal 2		2,73	6.276,71	6.276,28	2,43	-	-	-	6.276,28	-	6.276,28	100,00	99,86
3	FUNDAÇÕES	39,66	91.214,59	82.701,92	8.512,67	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal 3		39,66	91.214,59	82.701,92	8.512,67	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ALVENARIAS	2,76	6.359,41	6.185,09	174,32	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal 4		2,76	6.359,41	6.185,09	174,32	-	-	-	-	-	-	-	-
5	REVESTIMENTO DE PAREDES	6,23	14.322,02	13.291,16	1.030,86	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal 5		6,23	14.322,02	13.291,16	1.030,86	-	-	-	-	-	-	-	-
6	REVESTIMENTOS DE PISOS	47,21	108.594,00	93.497,17	15.096,83	28.835,17	28.835,17	28.835,17	28.835,17	28.835,17	28.835,17	30,84	26,55
Subtotal 6		47,21	108.594,00	93.497,17	15.096,83	28.835,17	28.835,17	28.835,17	28.835,17	28.835,17	28.835,17	30,84	26,55
Total Geral		100,00	229.999,90	205.000,05	24.999,85	28.835,17	28.835,17	28.835,17	28.835,17	28.835,17	38.159,88	18,61%	14,07%

RIACHO DA CRUZ - 08/12/2020

Local e Data

Tomador: MARIA BERNADETE NUNES RÉGO GOMES
 Nome: MARIA BERNADETE NUNES RÉGO GOMES
 Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Engenheiro Fiscal
 Nome: ZILTON PEDRO MENEZES MARINHO
 Cargo: ENGENHEIRO CIVIL





OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO - RIACHO DA CRUZ - RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.056.612-15/2018

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: SEGUNDA MEDIÇÃO – PERÍODO 27.06.2020 A 08.12.2020



FIGURA 1 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO;



FIGURA 2 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO;


Maria Bernadete Nunes Rego (Instituída)
Prefeita Municipal
CPF: 289 106 054 73


Zilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 211554676-8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO - RIACHO DA CRUZ - RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.056.612-15/2018

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: SEGUNDA MEDIÇÃO – PERÍODO 27.06.2020 A 08.12.2020



FIGURA 3 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO;



FIGURA 4 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO;


Maria Bernadete Nunes Rego
Prefeita Municipal
CPF- 289 106.054.72


ilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 211554676-8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO - RIACHO DA CRUZ - RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.056.612-15/2018

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: SEGUNDA MEDIÇÃO – PERÍODO 27.06.2020 A 08.12.2020



FIGURA 5 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO;



FIGURA 6 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO;


Maria Bernadete Nunes Régio Gomes
Prefeita Municipal
CPF- 289 106.054-77


Zilton Pedro Menezes
Engenheiro Civil
CREA/RN: 211554676-9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO - RIACHO DA CRUZ - RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.056.612-15/2018

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: SEGUNDA MEDIÇÃO – PERÍODO 27.06.2020 A 08.12.2020



FIGURA 7 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO;

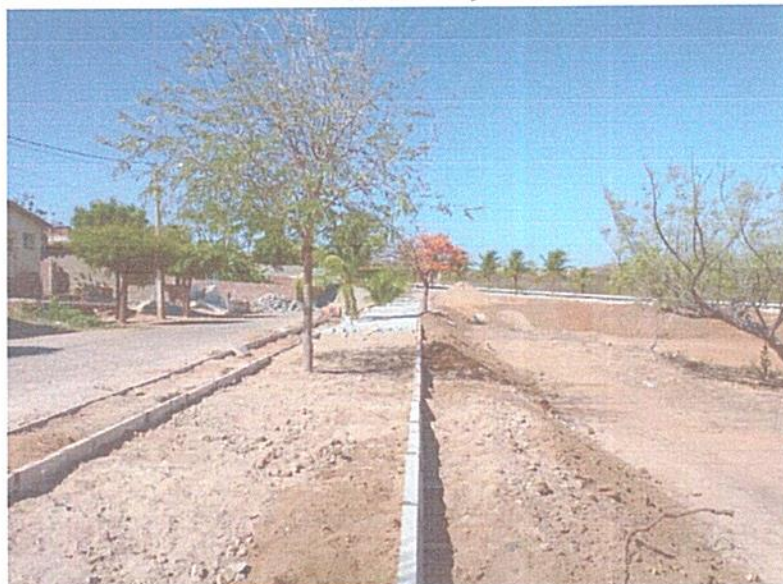


FIGURA 8 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO;



Maria Bernadete Nunes Rego Gomes
Prefeita Municipal
CPF: 289 106 054-72



Zilton Pedro Menezes
Engenheiro Civil
CREA/RN: 211554576-4

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO - RIACHO DA CRUZ - RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.056.612-15/2018

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: SEGUNDA MEDIÇÃO – PERÍODO 27.06.2020 A 08.12.2020

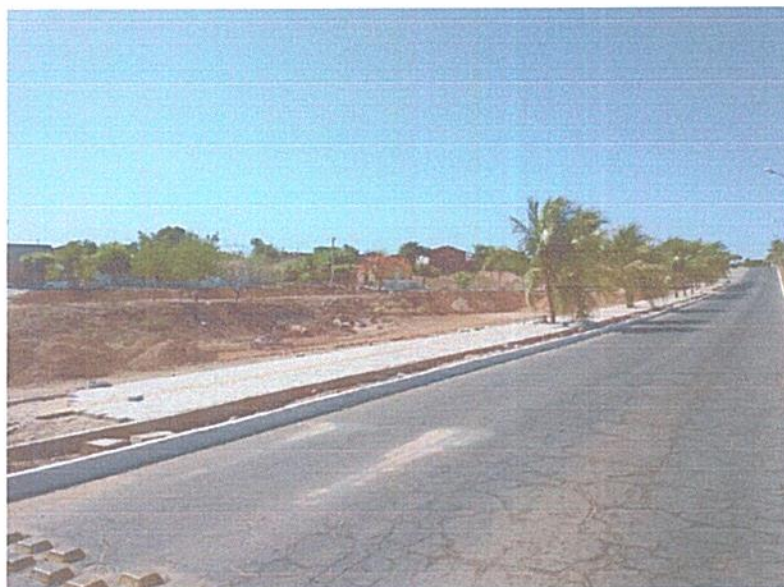


FIGURA 9 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO;

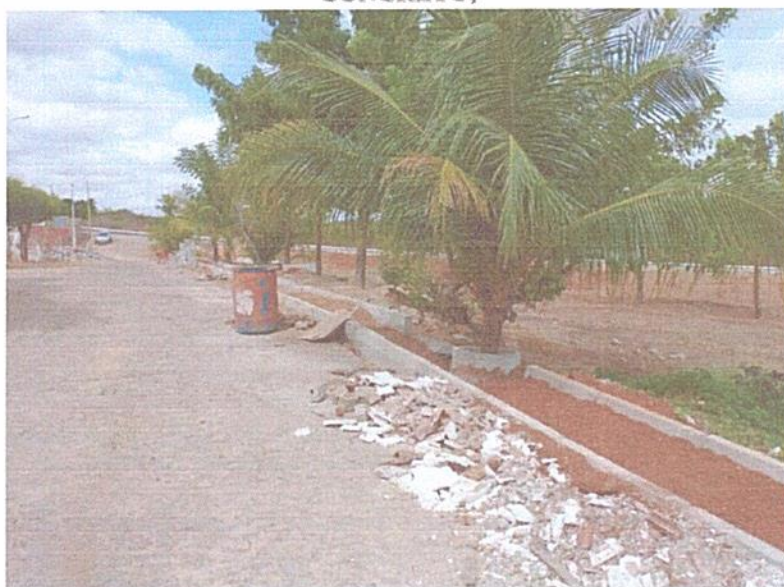


FIGURA 10 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO;


Maria Bernadete Nunes Rego (somu)
Prefeita Municipal
CPF: 289 106 054


Zilton Pedro Menezes
Engenheiro Civil
CREA/RN: 211554675
