

Ofício Nº 074/2020

Riacho da Cruz (RN), em 26 de junho de 2020.

REFERENTE:

GESTOR: MINISTÉRIO DA CULTURA.

PROGRAMA: CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO.

CONTRATO DE REPASSE: 1.063.207-18/2018

CONVENIO Nº: 882.352/2018

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 1.ª VISTORIA E MEDIÇÃO.

Senhor Gerente,

Após cumprida a **Primeira Etapa** do cronograma das obras, em implantação pelo programa Cultura: Preservação, Promoção E Acesso, através de Contrato de Repasse acima descrito, vimos solicitar a **primeira vistoria e medição** e o respectivo pagamento.

Para tanto, anexamos o mapa da **primeira medição**, que totaliza a execução no montante de **R\$ 19.706,11** (Dezenove mil, setecentos e seis reais e onze centavos) a ser custeado pelas fontes Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/Ministério da Cultura/ CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO.

Aproveitamos o ensejo, para renovarmos protestos de estima e consideração, ficando à disposição de quaisquer outras providências que viabilizem a conclusão do pleito.

Atenciosamente,



MARIA BERNADETE NUNES RÉGO GOMES  
Prefeita Municipal

Ilmo. Senhor.

**SILVIO JOSÉ CONCEIÇÃO.**

GIGOV/NA-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

NATAL - RN

Riacho da Cruz (RN), em 26 de junho de 2019.

À  
Caixa Econômica Federal  
GIGOV - NAT - NATAL/RN

REFERENTE:

GESTOR: MINISTÉRIO DA CULTURA.

PROGRAMA: CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO.

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CASA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ.

Senhor Superintendente/Gerente

1 Vimos, pelo presente, solicitar a essa Caixa Econômica Federal, autorizar o Saque de recursos do(s) contrato(s) sob referência, no valor abaixo discriminado:


Contrato de Repasse	Município	Valor repasse (R\$)	Valor contrapartida	
			Financeira R\$	Serviços R\$ (*)
1.063.207-18/2018	Riacho da Cruz	19.706,11	0,00	-

(\*) Para contrapartida em serviços

2 Para tanto, encaminhamos a Seguinte Documentação:

- ◆ Relatório fotográfico da 1.ª Medição;
- ◆ Relatório de execução físico-financeira;
- ◆ Relação de Solicitação/Comprovação de Pagamentos – OGU;
- ◆ Relatório Resumo de Empreendimento;
- ◆ PLE (dados, eventograma, detalhamento, cronograma, PLE e resumo);

Atenciosamente,





MARIA BERNADETE NUNES RÉGIO GOMES  
Prefeita Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

Contratado	CONTRATO DE REPASSE N. 1.063.207-18/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	PROGRAMA: CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO. PERÍODO DE EXECUÇÃO 20/05/2020 A 26/06/2020

Meta	Etapa/Fase	Descrição	Físico				
			Unidade	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
01	01	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CASA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ.	M2	21,04 %	6,71 %	21,04 %	6,71 %
<b>Total</b>				21,04 %	6,71 %	21,04 %	6,71 %

Financeiro									
Meta	Etapa/Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Repasse	Contra-Partida	Outros	Total	Repasse	Contra-Partida	Outros	Total
1	1.1	19.706,11	0,00	-	19.706,11	19.706,11	0,00	-	19.706,11
<b>Total</b>		19.706,11	0,00	-	19.706,11	19.706,11	0,00	-	19.706,11

Nome/Assinatura do contratado/Interveniente executor	Nome/Assinatura do responsável pela execução do projeto
 <b>MARIA BERNADETE NUNES RÉGO GOMES</b> Prefeita Municipal	 <b>MARIA BERNADETE NUNES RÉGO GOMES</b> Prefeita Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

Relação de Solicitação/ Comprovação de Pagamentos – OGU

Contratado  
Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN

Contrato de Repasse N.º 1.053.207-18/2018  
Programa: CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO.

Descrição do documento										Quitação do título		
Rec	Item	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Ident	Data	Tít. Créd	Nº do título de crédito	Nº de série ou Nº identificação	Valor	Data da Quitação	CH/OB
1	1	CERES CONSTRUÇÕES LTDA	10.652.220/0001-91	44.40.41	2	26/06/2020	FAT	S/N	-	19.706,11	-	-
<b>Total</b>										<b>19.706,11</b>		

**Legenda:**

Rec: 1 – OGU; 2 – Contrapartida; 3 – Outros


Ident.: 1 – Trabalho Social; 2 – Obras; 3 – Bens/Serviços; 4 – Máquinas/Equipamentos.

**Declaração do Contratado ou representante legal sob as penas da lei**

- a) Os documentos discriminados nesta Relação de solicitação/Comprovação de Pagamentos – OGU são pertinentes ao empreendimento, objeto do contrato nele referido, e atestamos que guardam inteira compatibilidade com as medições de obras e serviços executados, materiais, equipamentos e bens e serviços adquiridos, com a execução do trabalho social e com os preços contratuais.
- b) Foram observados os aspectos legais pertinentes, no que diz respeito as licitações e contratos de execução e fornecimento formalizados, decorrentes das obras e serviços realizados, materiais, equipamentos e bens adquiridos e execução do trabalho social com os recursos financeiros oriundos do presente contrato de repasse.
- c) Assumimos, perante o Agente Operador, a integral responsabilidade técnica pela qualidade das obras, serviços executados, bens adquiridos e do trabalho social realizado.
- d) Responsabilizamos-nos pela veracidade dos documentos integrantes nesta relação, bem como pela guarda dos mesmos, mantidos arquivados em pasta própria e em boa ordem no setor de contabilidade, para fins de atendimento aos aspectos legais e aqueles estabelecidos pela CAIXA, inclusive para disponibilização aos Órgãos de Controle Interno e Externo.
- e) Apresentaremos, com os elementos que integrarão o próximo pedido de solicitação de recursos, a identificação dos pagamentos realizados constantes desta Relação de Solicitação/Comprovação de Pagamentos.

Riacho da Cruz/RN, 26 de junho de 2020.

MARIA BERNADETTE NUNES REGO GOMES  
Prefeita Municipal



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

**OBJETO:** EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CASA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ.

**ENDEREÇO DA OBRA:** RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO - RIACHO DA CRUZ - RN

**CONTRATO DE REPASSE N°** 1.063.207-18/2018

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:** PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 20.05.2020 A 26.06.2020



**Figura 1 - PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO;**



**Figura 2 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA FIXAÇÃO DE TAPUMES COM TELHAS METÁLICAS;**

Zilton Pedro Menezes Marinho  
Engenheiro Civil  
CREARN 211554676-5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CASA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO - RIACHO DA CRUZ - RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.207-18/2018

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 20.05.2020 A 26.06.2020



Figura 3 - TAPUMES COM TELHAS METALICAS;

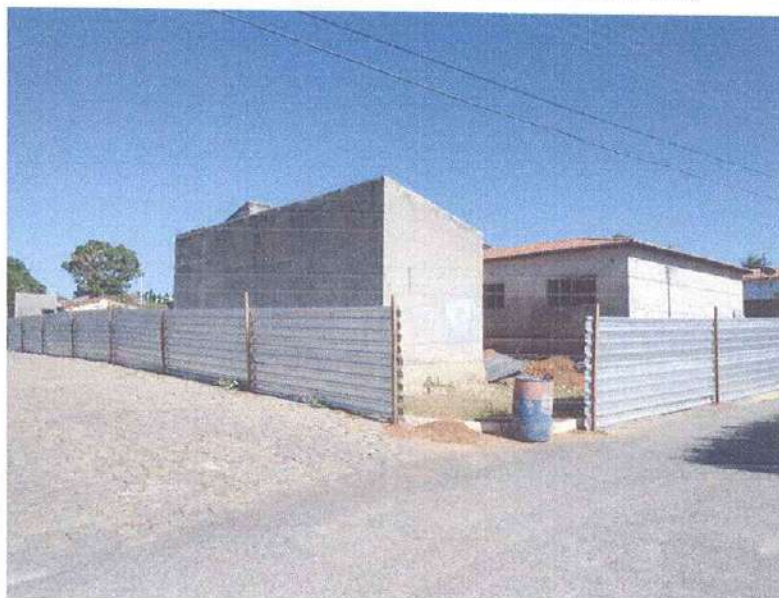


Figura 4 - TAPUMES COM TELHAS METALICAS;



Zilton Pedro Menezes Maranhão  
Engenheiro Civil  
CREARN 211554976-6

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

**OBJETO:** EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CASA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ.

**ENDEREÇO DA OBRA:** RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO - RIACHO DA CRUZ - RN

**CONTRATO DE REPASSE N°** 1.063.207-18/2018

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:** PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 20.05.2020 A 26.06.2020



**Figura 5 - TAPUMES COM TELHAS METÁLICAS;**

Zilton Pedro Menezes Marinho  
Engenheiro Civil  
CREARN 211554676-8



Responda antes de começar a preencher.

A participação do repasse/financiamento e da contrapartida é igual/proportional em todos os itens de investimento ou meios componentes do QCI?

SIM  NÃO (NUNCA ELIMINE OU APAGUE A PRIMEIRA LINHA OU A PRIMEIRA COLUNA, QUE ESTÃO OCULTAS E ELAS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A EXECUÇÃO DAS MACROS DESTE FORMULÁRIO)

**Relatório Resumo de Empendimiento**

RRE	Nº	001	BM	Item	Fotos (RAE Nº)	OGU		RRE - Tomador		#001			
						Nº do CT	Repassar(R\$)	Data do CT	CT - Valores (R\$)		CT - Programa		
	1	1.063.207-18/2018	1										
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
Discriminação dos itens/subitens invest.						Acumulado realizado incluído e período							
Item	Descrição	%	(R\$)	Letrados	Saldo	Realizado no período (R\$)	CP (R\$)	VI (R\$)	Repassar(R\$)	CP (R\$)	VI (R\$)	% Físico	% Financ
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,72	20.224,04	19.706,11	517,93	19.706,11	-	19.706,11	19.706,11	19.706,11	19.706,11	100,00	97,44
	Subtotal 1	6,72	20.224,04	19.706,11	517,93	19.706,11	-	19.706,11	19.706,11	19.706,11	19.706,11	100,00	97,44
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,69	2.067,44	2.014,40	53,04	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal 2	0,69	2.067,44	2.014,40	53,04	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	4,41	13.269,11	12.948,38	320,73	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal 3	4,41	13.269,11	12.948,38	320,73	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ESTRUTURAS	9,54	28.694,41	27.991,92	692,49	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal 4	9,54	28.694,41	27.991,92	692,49	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ALVENARIAS	1,23	3.708,94	3.619,84	89,10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal 5	1,23	3.708,94	3.619,84	89,10	-	-	-	-	-	-	-	-
6	COBERTURA	5,79	17.404,83	16.985,17	419,66	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal 6	5,79	17.404,83	16.985,17	419,66	-	-	-	-	-	-	-	-
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,79	2.387,73	2.330,07	57,66	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal 7	0,79	2.387,73	2.330,07	57,66	-	-	-	-	-	-	-	-
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,54	1.622,59	1.583,84	38,75	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal 8	0,54	1.622,59	1.583,84	38,75	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DIVISÓRIAS, BANCADAS, APARELHOS,	2,97	8.933,30	8.723,08	210,22	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal 9	2,97	8.933,30	8.723,08	210,22	-	-	-	-	-	-	-	-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINÁRIAS	5,03	15.129,25	14.752,18	377,07	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal 10	5,03	15.129,25	14.752,18	377,07	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ESQUADRIAS	13,34	40.135,24	39.110,47	1.024,77	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal 11	13,34	40.135,24	39.110,47	1.024,77	-	-	-	-	-	-	-	-
12	REVESTIMENTO DE TETOS	2,87	8.828,23	8.421,46	406,77	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal 12	2,87	8.828,23	8.421,46	406,77	-	-	-	-	-	-	-	-
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	10,46	31.561,51	30.813,98	747,53	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal 13	10,46	31.561,51	30.813,98	747,53	-	-	-	-	-	-	-	-
14	REVESTIMENTOS DE PISOS	21,93	65.662,43	64.080,88	1.581,55	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal 14	21,93	65.662,43	64.080,88	1.581,55	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PINTURA	13,25	39.858,25	39.004,46	853,79	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal 15	13,25	39.858,25	39.004,46	853,79	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,51	1.520,82	1.435,93	84,89	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal 16	0,51	1.520,82	1.435,93	84,89	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Geral	100,00	300.798,12	293.621,97	7.176,15	19.706,11	-	19.706,11	19.706,11	19.706,11	19.706,11	6,71%	8,71%

Tomador: *Maria Bernadete Nunes Régio Gomes* Nome: MARIA BERNADETE NUNES RÉGIO GOMES Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Engenheiro Fiscal: *Zilton Pedro Mansosa Mendonça* Nome: ZILTON PEDRO MANSOSA MENDONÇA Cargo: ENGENHEIRO CIVIL







PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063.207-18/2018	Nº SICONV 882.352/2018	IGIOV NA - NATAL	GESTOR MICULTURA	PROGRAMA CULTURA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA 22/07/2019
PROPORANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	MUNICÍPIO / UF RIACHO DA CRUZ/RN	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA	OBJETO CONCLUSÃO DA CASA DE CULTURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ			INÍCIO DA OBRA 20/05/2020
Nº CTEF 19050001/2020	EMPRESA EXECUTORA CERES CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 10.832.220/0001-91	OBJETO DO CTEF EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CASA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ			

Valor de Investimento: R\$ 293.621,97

ACOMPANHAMENTO

N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R\$)		Acumulado	% Global		Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (-) / Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.	Valores Medidos Acum. (R\$)
		No Período	19.706,11		No Período	6,71%					
1	25/06/2020	19.706,11	19.706,11	6,71%	21,04%	36	10	-26	-16,99%	19.706,11	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
<b>Total Medido Acumulado</b>		R\$: 19.706,11		6,71%				Dias Adiant. / Atraso: -26			-16,99%

Zilton Pedro Menezes Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 21.155.676-0

Resp. Tec. Fiscal: ZILTON PEDRO MENEZES MARINHO  
CREA / CAU: 2115546768  
ART: RN20200334641
