



Ofício n°: 185

Riacho da Cruz - RN, 09 de dezembro de 2021

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GIGOV

Assunto: 2ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.  
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1063352-78 - SICONV nº 890400

Objeto: Modernização da Quadra de Esportes do Bairro Acampamento II no Município de  
Proponente / Município de Riacho da Cruz - RN  
Tomador:


Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 2ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 286.500,00	R\$ 56.572,28	R\$ 113.501,89
Contrapartida Financeira:	R\$ 9.989,23	R\$ 1.972,48	R\$ 3.957,41
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 296.489,23	R\$ 58.544,76	R\$ 117.459,30
Execução Física:	-	19,75%	39,62%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.
3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.
4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Marcos Aurelio de Paiva Rêgo  
Prefeito Municipal



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Município de Riacho da Cruz - RN	Nº OPERAÇÃO 1063352-78	Nº SICONV 890400	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Modernização da Quadra de Esportes	MUNICÍPIO / UF Riacho da Cruz - RN	REPASSE 286.500,00	CONTRAPARTIDA 11.460,00	INVESTIMENTO 297.960,00	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: dez-21 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 1.470,77
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	---------------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)				Execução Física Acum.	
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período		
1.	OBRAS DE MORDERNIZAÇÃO DE QUADRA	Licitado / Em Execução	1044	m²	04110001/2020	2	296.489,23	58.914,54	58.544,76	117.459,30	39,62%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00%)	( 19,87%)	( 19,75%)	( 39,62%)	39,62%
							Repasse	286.500,00	56.929,61	56.572,28	113.501,89	
							Contrapartida	9.989,23	1.984,93	1.972,48	3.957,41	
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>296.489,23</b>	<b>58.914,54</b>	<b>58.544,76</b>	<b>117.459,30</b>	

Acumulado Anterior: 19,87%

Observações:

Riacho da Cruz - RN  
LocalRepresentante Tomador  
Nome: Marcos Aurelio de Paiva Rêgo  
Cargo: Prefeito MunicipalResponsável Social  
Nome:  
Cargo:quinta-feira, 9 de dezembro de 2021  
DataResponsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Zilton Pedro Menezes Marinho  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: 2115546768  
ART/RRT: RN20200315453Responsável Financeiro  
Nome:  
Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063352-78	Nº SICONV 890400	PROPONENTE TOMADOR Município de Riacho da Cruz - RN	APELIDO EMPREENDIMENTO Modernização da Quadra de Esportes	NOME DA EMPRESA SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Nº CTEF 4110001/202
---------------------------	---------------------	--	--	---	------------------------

Medição: **2** Período: **08/10/2021 a 09/12/2021** % Realizado Período.: **19,75%** % Realizado Acum.: **39,62%**

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
4	INFRAESTRUTURA - SAPATAS
5	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES
6	SUPERESTRUTURA - PILARETES
7	EXECUÇÃO DO ALAMBRADO
8	EXECUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ALVEN
9	PISO EM GRANILITE
10	ESQUADRIAS
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS - INSTALAÇÃO
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS - LUMINARIAS
13	METAIS E LOUÇAS
14	PINTURAS E ACABAMENTOS

OBRA DE MODERNIZAÇÃO DE	Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																										
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										

Medições	Data das Medições												
	07/10/2021	09/12/2021											
Período:	%	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
	R\$	19,87%	19,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	58.914,54	58.544,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	19,87%	39,62%	39,62%	39,62%	39,62%	39,62%	39,62%	39,62%	39,62%	39,62%	39,62%	39,62%
	R\$	58.914,54	117.459,30	117.459,30	117.459,30	117.459,30	117.459,30	117.459,30	117.459,30	117.459,30	117.459,30	117.459,30	117.459,30

Riacho da Cruz - RN  
Local  
quinta-feira, 7 de outubro de 2021  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Zilton Pedro Menezes Marinho  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: 2115546768  
ART/RRT: RN20200315453

*Marcos Aurelio de Paiva Rego*  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF- 503.344.094-20

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: SEGUNDA MEDIÇÃO – PERÍODO 08.10.2021 A 09.12.2021



FIGURA 1 – FABRICAÇÃO E CURA E LAJES PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO (ARQUIBANCADAS);

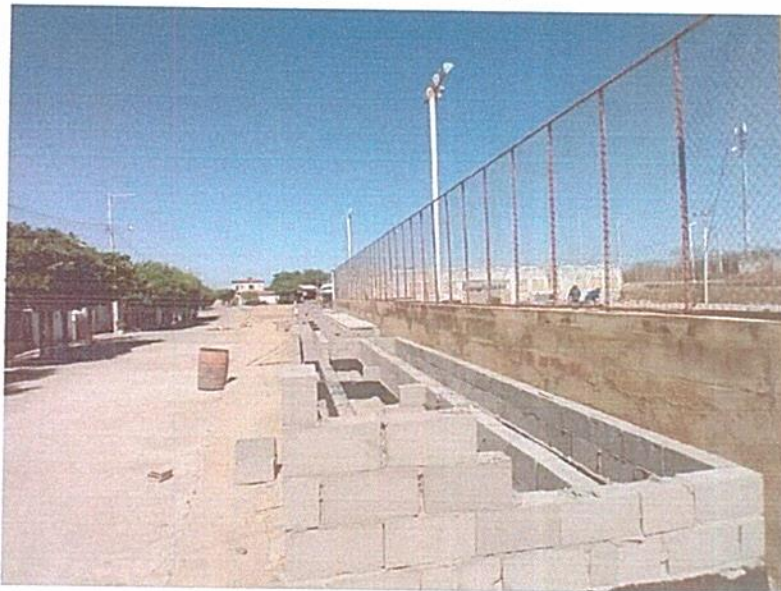


Figura 2 – EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (ARQUIBANCADAS);

*Marcos Aurelio de Paiva Rêgo*  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 503.244.094-70

*Eng.º Menezes Marinho*  
Engenheiro Civil  
CREA/RN: 2115546768  
PATRICULA: 120620-6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: SEGUNDA MEDIÇÃO – PERÍODO 08.10.2021 A 09.12.2021



Figura 3 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (ARQUIBANCADAS);



Figura 4 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (ARQUIBANCADAS);

*Marcos Aurelio de Paiva Rêgo*  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 502.244.094-20

*Alton Pedro Menezes Marinho*  
Engenheiro Civil  
CREAIRN: 2115546768  
MATRICULA: 120620-6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: SEGUNDA MEDIÇÃO – PERÍODO 08.10.2021 A 09.12.2021

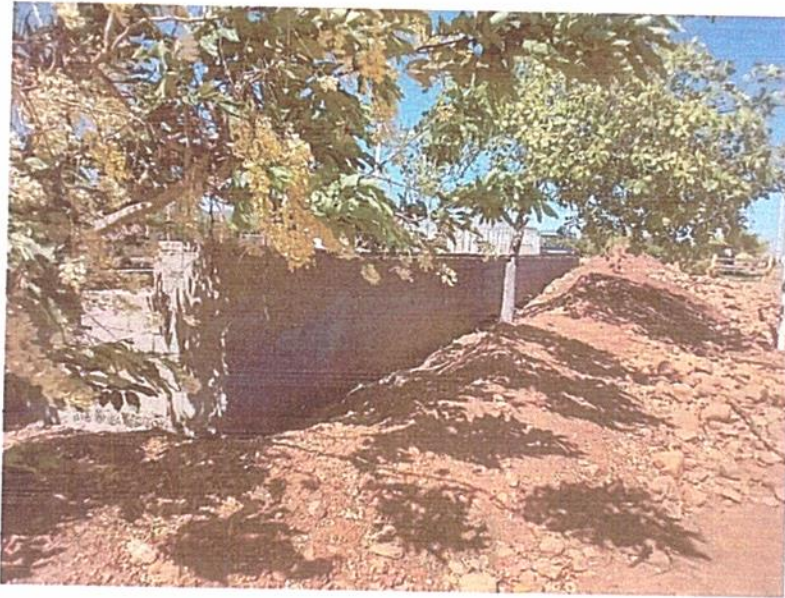


Figura 5 – EXECUÇÃO DE CHAPISCO;

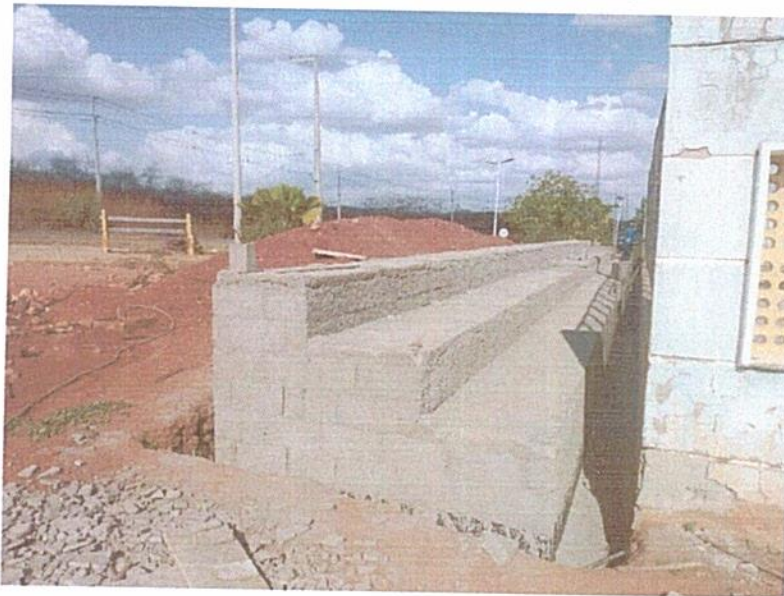


Figura 6 - EXECUÇÃO DE CHAPISCO E ASSENTAMENTO DE LAJES PRÉ-FABRICADAS;

*Marcos Aurelio de Paiva Rêgo*  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF- 502.244.094-20

*Zilton Pedro Menezes Marinho*  
Engenheiro Civil  
CREA/RN: 2115546768  
MATRICULA: 120620-6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: SEGUNDA MEDIÇÃO – PERÍODO 08.10.2021 A 09.12.2021

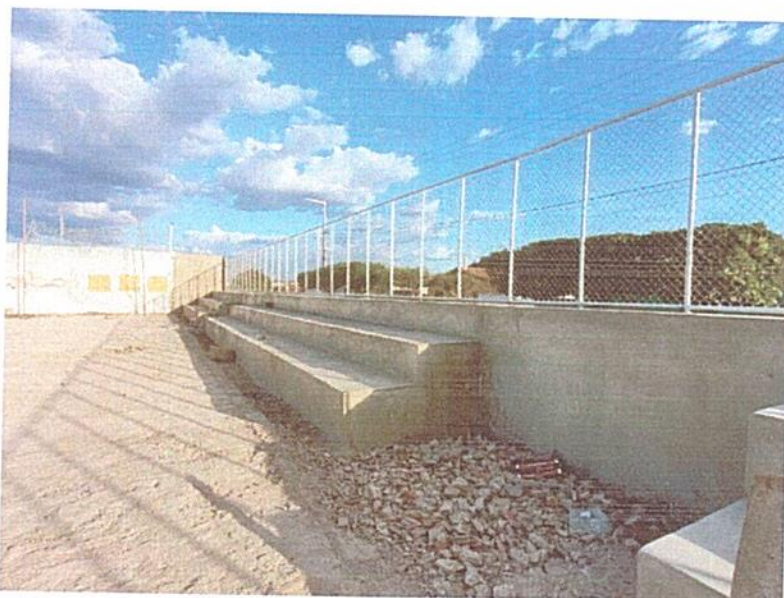


Figura 7 – EXECUÇÃO DE REBOCO EM ARQUIBANCADAS;



Figura 8 – EXECUÇÃO E PINTURA DE ALAMBRADOS, REBOCO E ACABAMENTOS EM ARQUIBANCADAS;

Marcos Aurelio de Paula Reis  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 503.244.094-70

Hilton Pedro Menezes Marinho  
Engenheiro Civil  
CREAIRN: 2115546768  
MATRICULA: 120620-6

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

**OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN**

**ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ–RN**

**CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: SEGUNDA MEDIÇÃO – PERÍODO 08.10.2021 A 09.12.2021**



**Figura 9 - EXECUÇÃO E PINTURA DE ALAMBRADOS, REBOCO E ACABAMENTOS EM ARQUIBANCADAS;**



**Figura 10 – EXECUÇÃO E PINTURA DE ALAMBRADOS, REBOCO E ACABAMENTOS EM ARQUIBANCADAS;**

  
**Marcos Aurelio de Paiva Kean**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 503.744.094-20

  
**Zilton Pedro Menezes Marinho**  
Engenheiro Civil  
CREA/RN: 2115546768  
MATRICULA: 120620-6
