



Ofício nº: 049-2022

Riacho da Cruz - RN, 08 de junho de 2022

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 4ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1063352-78 - SICONV nº 890400

Objeto: Modernização da Quadra de Esportes do Bairro Acampamento II no Município de
Proponente / Município de Riacho da Cruz - RN
Tomador:

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 4ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 286.500,00	R\$ 20.808,12	R\$ 242.412,88
Contrapartida Financeira:	R\$ 9.989,23	R\$ 725,50	R\$ 8.452,07
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 296.489,23	R\$ 21.533,62	R\$ 250.864,95
Execução Física:	-	7,26%	84,61%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.
3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.
4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,


Marcos Aurelio de Paiva Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 503.344.094-20

Marcos Aurelio de Paiva Rêgo
Prefeito Municipal



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Município de Riacho da Cruz - RN	Nº OPERAÇÃO 1063352-78	Nº SICONV 890400	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Modernização da Quadra de Esportes	MUNICÍPIO / UF Riacho da Cruz - RN	REPASSE 286.500,00	CONTRAPARTIDA 11.460,00	INVESTIMENTO 297.960,00	Nº RRE 4	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: Jun-22 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 1.470,77
--------------------------------	-------------------------------------------	------------------------	--------------------	---------------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)				Execução Física Acum.	
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período		
1.	OBRAS DE MORDERNIZAÇÃO DE QUADRA	Licitado / Em Execução	1044	m²	04110001/2020	4	296.489,23	229.331,33	21.533,62	250.864,95	84,61%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(77,35%)	(7,26%)	(84,61%)	84,61%
							Repasse	286.500,00	221.604,76	20.808,12	242.412,88	
							Contrapartida	9.989,23	7.726,57	725,50	8.452,07	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	296.489,23	229.331,33	21.533,62	250.864,95	

Acumulado Anterior: 77,35%

Observações:

Riacho da Cruz - RN

Local

Representante Tomador

Nome: Marcos Aurelio de Paiva Rêgo

Cargo: Prefeito Municipal

Marcos Aurelio de Paiva Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 503.344.094-20

quarta-feira, 8 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Zilton Pedro Menezes Marinho

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 2115546788

ART/RRT: RN20200315453

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063352-78	Nº SICONV 890400	PROPONENTE TOMADOR Município de Riacho da Cruz - RN	APELIDO EMPREENDIMENTO Modernização da Quadra de Esportes	NOME DA EMPRESA SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Nº CTEF 04110001/202
---------------------------	---------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------

Medição: **4** Período: **27/04/2022 a 08/06/2022** % Realizado Período.: **7,26%** % Realizado Acum.: **84,61%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																									
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1																									
4	INFRAESTRUTURA - SAPATAS	1																									
5	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES	1																									
6	SUPERESTRUTURA - PILARETES	1																									
7	EXECUÇÃO DO ALAMBRADO	2																									
8	EXECUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ALVENARIA	2																									
9	PISO EM GRANILITE	3																									
10	ESQUADRIAS																										
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS - INSTALAÇÕES	3																									
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS - LUMINARIAS,	4																									
13	METAIS E LOUÇAS																										
14	PINTURAS E ACABAMENTOS																										

Medições	Data das Medições											
	07/10/2021	09/12/2021	26/04/2022	08/06/2022								
Período:	%	19,87%	19,75%	37,73%	7,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado:	R\$	58.914,54	58.544,76	111.872,03	21.533,62	-	-	-	-	-	-	-
	%	19,87%	39,62%	77,35%	84,61%	84,61%	84,61%	84,61%	84,61%	84,61%	84,61%	84,61%
	R\$	58.914,54	117.459,30	229.331,33	250.864,95	250.864,95	250.864,95	250.864,95	250.864,95	250.864,95	250.864,95	250.864,95

Riacho da Cruz - RN
Local
quarta-feira, 8 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Zilton Pedro Menezes Marinho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 2115546768
ART/RRT: RN20200315453

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

**OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN**

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUARTA MEDIÇÃO – PERÍODO 27.04.2022 A 08.06.2022



FIGURA 1 – FIXAÇÃO DE POSTE PARA ILUMINAÇÃO COM REFLETORES;



Figura 2 – FIXAÇÃO DE POSTE PARA ILUMINAÇÃO COM REFLETORES;

Zilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 2115546768
MATRICULA: 120620-6

Marcos Aurelio de Paula Neto
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 503.344.094-21

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUARTA MEDIÇÃO – PERÍODO 27.04.2022 A 08.06.2022



Figura 3 – EXECUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS POSTES;



Figura 4 – INSTALAÇÃO DE REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA;


Eilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 2115546768
MATRICULA: 120620-6


Marcos Aurelio de Paiva Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 503.344.094-20

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUARTA MEDIÇÃO – PERÍODO 27.04.2022 A 08.06.2022



Figura 5 – INSTALAÇÃO DE REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA;



Figura 6 – EXECUÇÃO DE PONTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (TOMADAS);

Clilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 2115546768
MATRICULA: 120620-6

Marcos Aurélio de Paula Régio
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 503.344.094-20

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUARTA MEDIÇÃO – PERÍODO 27.04.2022 A 08.06.2022

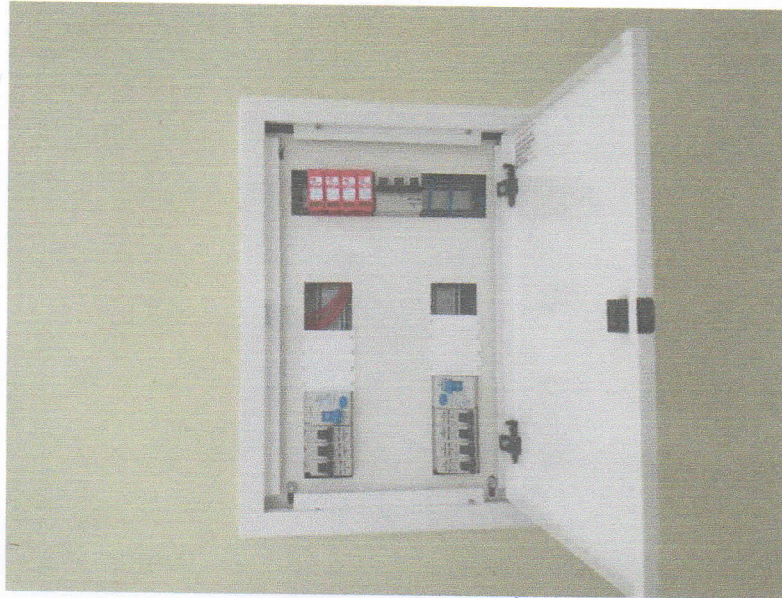



Figura 7 – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;


Zilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 2115546768
MATRICULA: 120620-6


Marcos Aurelio de Paiva Rego
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 503.344.094-20
