

Ofício de Encaminhamento de Documentação Relativa ao Desbloqueio de Recursos por VISTORIA

Ofício 073/2022

Riacho da Cruz - RN, 03 de agosto de 2022

À
Caixa Econômica Federal
GIGOV Natal

Assunto: Encaminhamento de documentos referentes à Medição **05** do Contrato de Repasse/
Termo de Compromisso nº **1.063.352-78/2019**

Senhor Gerente

1. Solicitamos autorização para o desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse/ Termo de Compromisso identificado acima e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito listada abaixo:

2. Declaramos ainda, que a **Placa de Obra** se encontra afixada em local adequado e em conformidade com o que preconiza a legislação vigente.

2.1 Desbloqueio por VISTORIA

Documento/ Procedimento	Sim	Não	Não se aplica
Na Solicitação de Desbloqueio			
Ofício de encaminhamento da Documentação de Desbloqueio	x		
Ofício de solicitação de autorização de desbloqueio;	x		
RRE - Relatório Resumido do Empreendimento	x		
BM ou PLE conforme sistemática de acompanhamento;	x		
QCI vigente, no primeiro desbloqueio ou em caso de sua alteração;			x
Cronograma Físico-Financeiro vigente, contemplando a evolução do Objeto, no primeiro desbloqueio ou em caso de sua alteração;			x
Após realização da Vistoria			
Nota Fiscal com nome do Programa e número do Contrato de Repasse		x	
*Depósito e classificação de contrapartida		x	
Relatório "Documentos de Liquidação"		x	
*Relação de fornecedores, contendo CTEF, nome, CNPJ, Valor (MO41211)		x	

*Para contratos que não tramitam na Plataforma +Brasil

MARCOS
AURELIO
DE PAIVA
REGO:5033
4409420

Assinado de forma
digital por
MARCOS AURELIO
DE PAIVA
REGO:5033440942
0
Dados: 2022.08.03
12:51:01 -03'00'

2.2 No caso de 1ª **Solicitação de Desbloqueio**, além da documentação do item 2.1:

Documento/ Procedimento	Sim	Não	Não se aplica
CR vinculados aos exercícios financeiros a partir de 2018			
Declaração que o Contratado recebeu e aprovou o Projeto Executivo de Acessibilidade e que sua execução se dará de forma a garantir o cumprimento dos itens previstos na Lista de Verificação de Acessibilidade;			x
Todos os Contratos			
Ordem de serviço/compra para o fornecedor, caso não apresentada até AIO			x

2.3 No caso de **Última Solicitação de Desbloqueio** além da documentação do item 2.1:

Documento/ Procedimento	Sim	Não	Não se aplica
CR vinculados aos exercícios financeiros a partir de 2018			
Laudo de Conformidade em Acessibilidade;	x		
Documento que comprove o recebimento do objeto do CR, por parte do Contratado, conforme legislação aplicada ao processo de licitação e contratação;	x		
CR de pavimentação asfáltica do MDR			
Laudo de Controle Tecnológico acompanhado de ART/RRT de responsabilidade pela sua realização, bem como ateste correspondente, emitido pelo Contratado;			x
Todos			
Documento Definitivo de Titularidade de área, caso não apresentado em fase anterior;			x

MARCOS AURELIO DE PAIVA
REGO:50334409420

Assinado de forma digital por
MARCOS AURELIO DE PAIVA
REGO:50334409420
Dados: 2022.08.03 12:51:22
-03'00'

Marcos Aurélio de Paiva Rêgo
Prefeito
CPF: 503.344.094-20

Ofício Nº 074/2022

Riacho da Cruz (RN), em 03 de Agosto de 2022.

REFERENTE:

GESTOR: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

PROGRAMA: ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO.

CONTRATO DE REPASSE: 1.063.352-78/2019

CONVÊNIO Nº: 890.400

OBJETO: “MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN”

ASSUNTO: INFORMAÇÕES SOBRE VALOR FINAL DO OBJETO.

Vimos através deste informar o motivo pelo qual a medição enviada junto a este ofício apresenta um acumulado final no montante de R\$ 291.069,41 e deste modo díspar dos R\$ 296.489,23 previsto no contrato 04110001/2020 – Entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ e a empresa SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI. A diferença no valor de R\$ 5.419,82 é referente à não execução dos itens de esquadrias, incluídos dentro evento “ITENS COMPLEMENTARES” este que não foi atestado na ocasião da ultima medição do objeto.

Justifica-se para tanto que o ocorrido se deu pelo fato de em orçamento está previsto a substituição de todas as portas existentes por novas, entretanto verificou-se que a maioria estavam em excelente estado de conservação sendo realizada apenas a substituição de duas portas e sete fechaduras, situação que não afeta a funcionalidade da edificação. Entendendo também que a não realização do pagamento referente a estes serviços implica no atendimento ao princípio de não ocasionar prejuízo ao erário e a administração pública.

Ressaltamos também que no atendimento a execução dos itens 1.8.4.4 – “LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017.” e 1.8.4.6 – “PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE.” A empresa responsável pela execução em virtude da

MARCOS
AURELIO DE
PAIVA
REGO:50334
409420

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

indisponibilidade no mercado das lâmpadas fluorescentes e vapor de mercúrio especificadas no orçamento da obra, realizou com autorização da fiscalização a substituição das mesmas por luminárias do tipo LED, que oferecem uma maior durabilidade, eficiência e economia energética e desde modo não ocasionando prejuízo ao erário e a administração pública.

Aproveitamos ainda para informar a conclusão total dos serviços referentes a execução do objeto.

Nada mais para o momento, atenciosamente:

MARCOS AURELIO DE PAIVA
REGO:50334409420

Assinado de forma digital por
MARCOS AURELIO DE PAIVA
REGO:50334409420
Dados: 2022.08.03 12:34:27
-03'00'

.....
MARCOS AURELIO DE PAIVA RÊGO

Prefeito Municipal
Documento assinado digitalmente



ZILTON PEDRO MENEZES MARINHO
Data: 03/08/2022 12:56:15-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

.....
ZILTON PEDRO MENEZES MARINHO
Engenheiro Civil- CREA nº 211554676-8
Matricula- 120620-6

Ao Ilmo. Senhor.

SILVIO JOSÉ CONCEIÇÃO.
GIGOV/NA-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
NATAL - RN



Ofício nº: 075/2022

Riacho da Cruz - RN, 03 de agosto de 2022

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 5ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1063352-78 - SICONV nº 890400

Objeto: Modernização da Quadra de Esportes do Bairro Acampamento II no Município de
Proponente / Município de Riacho da Cruz - RN
Tomador:

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 5ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 286.500,00	R\$ 38.849,90	R\$ 281.262,78
Contrapartida Financeira:	R\$ 9.989,23	R\$ 1.354,56	R\$ 9.806,63
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 296.489,23	R\$ 40.204,46	R\$ 291.069,41
Execução Física:	-	13,56%	98,17%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

MARCOS AURELIO DE PAIVA
REGO:50334409420

Assinado de forma digital por
MARCOS AURELIO DE PAIVA
REGO:50334409420
Dados: 2022.08.03 12:52:34
-03'00'

Marcos Aurelio de Paiva Rêgo
Prefeito Municipal



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Município de Riacho da Cruz - RN	Nº OPERAÇÃO 1063352-78	Nº SICONV 890400	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Modernização da Quadra de Esportes	MUNICÍPIO / UF Riacho da Cruz - RN		REPASSE 286.500,00	CONTRAPARTIDA 11.460,00	INVESTIMENTO 297.960,00	Nº RRE 5

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-22 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 1.470,77
---------------------------------------	--	----------------------------	---------------------------	--

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	OBRAS DE MORDERNIZAÇÃO DE QUADR	Concluído	1044	m²	04110001/2020	5	296.489,23	250.864,95	40.204,46	291.069,41	98,17%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(84,61%)	(13,56%)	(98,17%)	
							Repasse	286.500,00	242.412,88	38.849,90	281.262,78	
							Contrapartida	9.989,23	8.452,07	1.354,56	9.806,63	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	296.489,23	250.864,95	40.204,46	291.069,41	98,17%

Acumulado Anterior: 84,61%

Observações:

Riacho da Cruz - RN

Local

quarta-feira, 3 de agosto de 2022

Data

Representante Tomador

Nome: Marcos Aurelio de Paiva Rêgo
Cargo: Prefeito Municipal

MARCOS AURELIO DE PAIVA
REGO:50334409420

Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO:50334409420
Dados: 2022.08.03 12:53:11 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Zilton Pedro Menezes Marinho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 2115546768
ART/RRT: RN20200315453



Documento assinado digitalmente
ZILTON PEDRO MENEZES MARINHO
Data: 03/08/2022 12:58:20-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063352-78	Nº SICONV 890400	PROPONENTE TOMADOR Município de Riacho da Cruz - RN	APELIDO EMPREENDIMENTO Modernização da Quadra de Esportes	NOME DA EMPRESA SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Nº CTEF 04110001/202
---------------------------	---------------------	--	--	---	-------------------------

Medição: **5** Período: **09/06/2022 a 03/08/2022** % Realizado Período.: **13,56%** % Realizado Acum.: **98,17%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																									
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1																									
4	INFRAESTRUTURA - SAPATAS	1																									
5	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES	1																									
6	SUPERESTRUTURA - PILARETES	1																									
7	EXECUÇÃO DO ALAMBRADO	2																									
8	EXECUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ALVENA	2																									
9	PISO EM GRANILITE	3																									
10	ESQUADRIAS	5																									
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS - INSTALAÇÕES	3																									
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS - LUMINARIAS,	4																									
13	METAIS E LOUÇAS	5																									
14	PINTURAS E ACABAMENTOS	5																									
15	ITENS COMPLEMENTARES																										

Medições	Data das Medições											
	07/10/2021	09/12/2021	26/04/2022	08/06/2022	03/08/2022							
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	19,87%	19,75%	37,73%	7,26%	13,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	58.914,54	58.544,76	111.872,03	21.533,62	40.204,46	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	19,87%	39,62%	77,35%	84,61%	98,17%	98,17%	98,17%	98,17%	98,17%	98,17%	98,17%	98,17%
R\$	58.914,54	117.459,30	229.331,33	250.864,95	291.069,41	291.069,41	291.069,41	291.069,41	291.069,41	291.069,41	291.069,41	291.069,41

Riacho da Cruz - RN

Local

quarta-feira, 3 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Zilton Pedro Menezes Marinho

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 2115546768

ART/RRT: RN20200315453

Documento assinado digitalmente

ZILTON PEDRO MENEZES MARINHO

Data: 03/08/2022 12:59:41-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 **SICONV** Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA MEDIÇÃO – PERÍODO 09.06.2022 A 03.08.2022

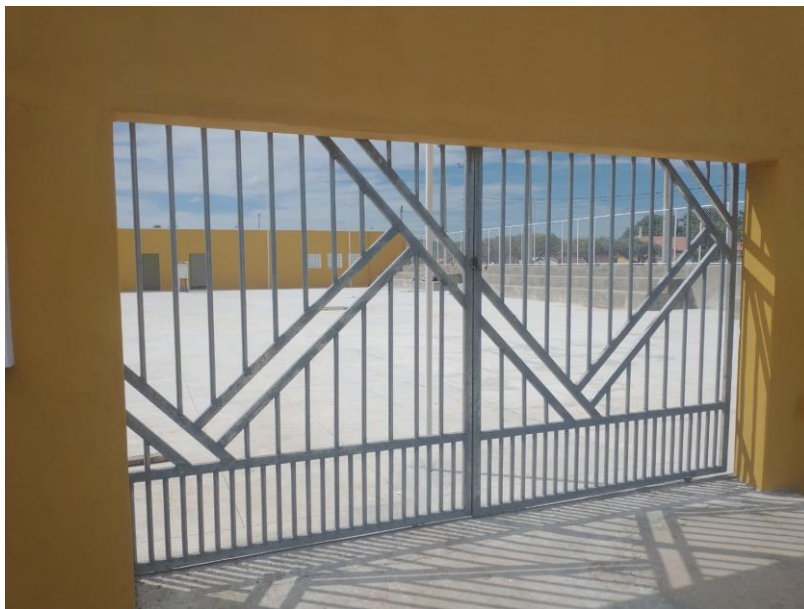


FIGURA 1 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS (PORTÃO DE ENTRADA);



Figura 2 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS E FECHADURAS;

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ–RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 **SICONV** Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA MEDIÇÃO – PERÍODO 09.06.2022 A 03.08.2022



Figura 3 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS E FECHADURAS;

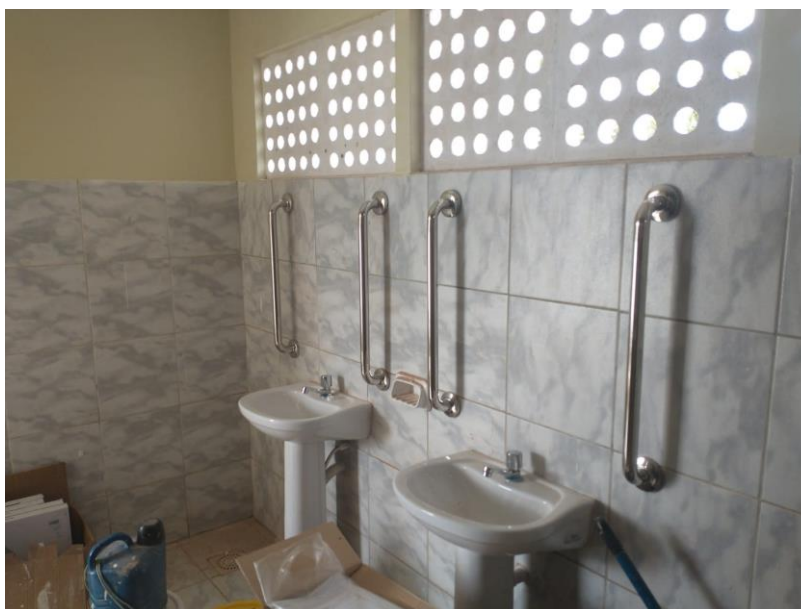


Figura 4 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE BARRAS DE APOIO E ACESSIBILIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS;

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ–RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 **SICONV** Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA MEDIÇÃO – PERÍODO 09.06.2022 A 03.08.2022



Figura 5 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE BARRAS DE APOIO E ACESSIBILIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS;



Figura 6 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE BARRAS DE APOIO E ACESSIBILIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS;

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA MEDIÇÃO – PERÍODO 09.06.2022 A 03.08.2022



Figura 7 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE BARRAS DE APOIO E ACESSIBILIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS;



Figura 8 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE BARRAS DE APOIO E ACESSIBILIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS;

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 **SICONV** Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA MEDIÇÃO – PERÍODO 09.06.2022 A 03.08.2022



Figura 9 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE BARRAS DE APOIO E ACESSIBILIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS;



Figura 10 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE BARRAS DE APOIO E ACESSIBILIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS;

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 **SICONV** Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA MEDIÇÃO – PERÍODO 09.06.2022 A 03.08.2022



Figura 11 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES;

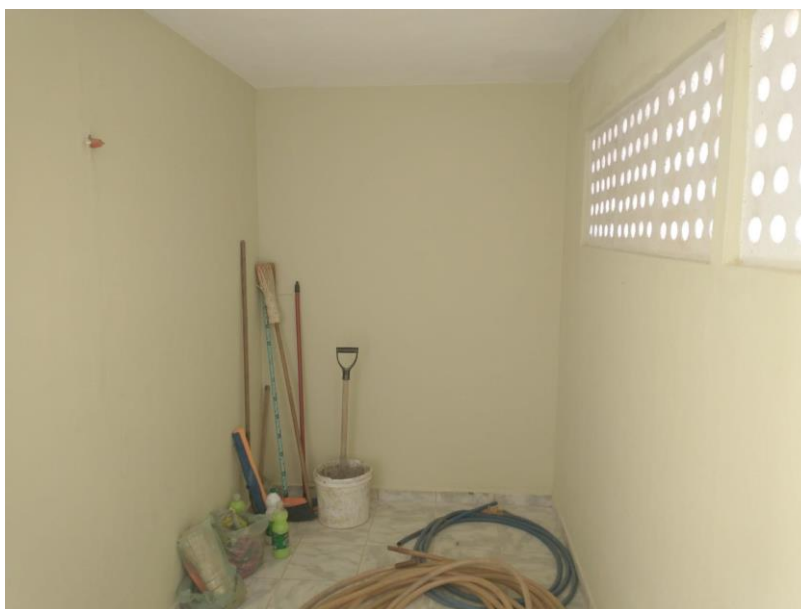


Figura 12 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA;

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ–RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 **SICONV** Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA MEDIÇÃO – PERÍODO 09.06.2022 A 03.08.2022



Figura 13 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS, MARCAÇÃO E PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA;

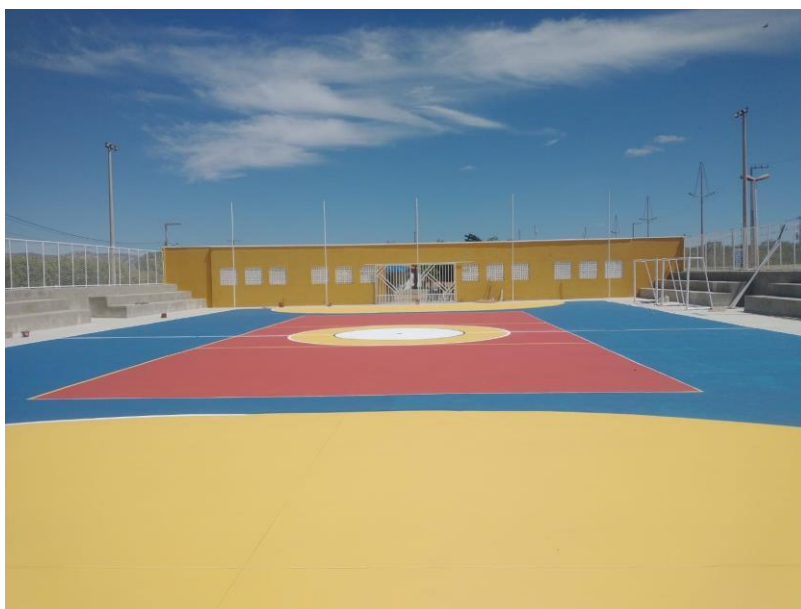


Figura 14 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS, MARCAÇÃO E PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA;

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ–RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA MEDIÇÃO – PERÍODO 09.06.2022 A 03.08.2022



Figura 15 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS, MARCAÇÃO E PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA;



Figura 16 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS;

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ–RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA MEDIÇÃO – PERÍODO 09.06.2022 A 03.08.2022



Figura 17 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS;



Figura 18 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS;

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ–RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 **SICONV** Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA MEDIÇÃO – PERÍODO 09.06.2022 A 03.08.2022



Figura 19 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS;



Figura 20 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS;

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA MEDIÇÃO – PERÍODO 09.06.2022 A 03.08.2022



Figura 21 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS;



Figura 22 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS;
