

MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN				BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 08									
Tomador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ</b>				Contrato de Prestação de Serviço Nº: <b>050101/2022</b>		Data: <b>05/01/2022</b>		Data emissão do BM <b>13/12/2022</b>		Período de referência <b>05.11.2022 a 13.12.2022</b>		Valor do Investimento <b>R\$ 470.321,35</b>	
Empresa Contratada <b>ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</b>				Objeto: <b>RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN</b>								Valor da Contrapartida <b>-</b>	
CNPJ <b>14.634.195/0001-36</b>				Endereço da Obra: <b>TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA</b>								Valor do CTEF <b>R\$ 54.889,32</b>	
Item	Código	Referência	Discriminação dos Serviços Contratados	CONTRATADO				EXECUTADO FÍSICO (Quantidades)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)		
				Unid.	Quantid.	P.Unit.	P.Total	Acumulado até a medição anterior	Medido neste período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido neste período	Acumulado incluindo o período
<b>RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN</b>													
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
1.1	00051	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00	R\$ 353,08	R\$ 2.118,48	6,00	0,00	6,00	R\$ 2.118,48	R\$ -	R\$ 2.118,48
<b>Total do item</b>							<b>R\$ 2.118,48</b>				<b>R\$ 2.118,48</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.118,48</b>
<b>2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA</b>													
2.1	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M3	230,32	R\$ 128,78	R\$ 29.660,61	230,32	0,00	230,32	R\$ 29.660,61	R\$ -	R\$ 29.660,61
2.2	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	230,32	R\$ 8,14	R\$ 1.874,80	230,32	0,00	230,32	R\$ 1.874,80	R\$ -	R\$ 1.874,80
<b>Total do item</b>							<b>R\$ 31.535,41</b>				<b>R\$ 31.535,41</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 31.535,41</b>
<b>3 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO</b>													
3.1	04116	ORSE	LIMPEZA DE CANAIS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COMPREENDENDO REMOÇÃO E CARGA DE SOLOS MOLES, MATERIA ORGÂNICA OU ENTULHOS	M3	76,77	R\$ 172,35	R\$ 13.231,31	76,77	0,00	76,77	R\$ 13.231,31	R\$ -	R\$ 13.231,31
<b>Total do item</b>							<b>R\$ 13.231,31</b>				<b>R\$ 13.231,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 13.231,31</b>
<b>4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>													
4.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	9,60	R\$ 139,12	R\$ 1.335,55	9,60	0,00	9,60	R\$ 1.335,55	R\$ -	R\$ 1.335,55
<b>Total do item</b>							<b>R\$ 1.335,55</b>				<b>R\$ 1.335,55</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.335,55</b>

*Marcos Aureo de Pava Rêgo*  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 503.344.094-20


Avenida Camila de Lélis, 285 – Centro – Riacho da Cruz/RN – CEP 59.820-000 – CNPJ. 08.153.454/0001-04  
Site: [www.riachodacruz.rn.gov.br](http://www.riachodacruz.rn.gov.br) - E-mail: [pmriachodacruz@gmail.com](mailto:pmriachodacruz@gmail.com) - Fone: (84) 3374-0002

*Zilton Pedro Menezes Marinho*  
Eng. Civil - CREA-RN Nº211554676-8  
Matricula Nº 120.620-6

MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN				BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 08											
Tomador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ</b>				Contrato de Prestação de Serviço Nº: <b>050101/2022</b>		Data: <b>05/01/2022</b>		Data emissão do BM <b>13/12/2022</b>		Período de referência <b>05.11.2022 a 13.12.2022</b>		Valor do Investimento <b>R\$ 470.321,35</b>			
Empresa Contratada <b>ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</b>				Objeto: <b>RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN</b>										Valor da Contrapartida <b>-</b>	
CNPJ <b>14.634.195/0001-36</b>				Endereço da Obra: <b>TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA</b>										Valor do CTEF <b>R\$ 54.889,32</b>	
Item	Código	Referência	Discriminação dos Serviços Contratados	CONTRATADO				EXECUTADO FÍSICO (Quantidades)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				
				Unid.	Quantid.	P.Unit.	P.Total	Acumulado até a medição anterior	Medido neste período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido neste período	Acumulado incluindo o período		
<b>5 ALVENARIAS E ELEMENTOS</b>															
5.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M2	48,24	R\$ 79,78	R\$ 3.848,59	48,24	0,00	48,24	R\$ 3.848,59	R\$ -	R\$ 3.848,59		
<b>Total do item</b>							<b>R\$ 3.848,59</b>				<b>R\$ 3.848,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.848,59</b>		
<b>6 REVESTIMENTO DE PAREDES</b>															
6.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	491,71	R\$ 3,79	R\$ 1.863,58	491,71	0,00	491,71	R\$ 1.863,58	R\$ -	R\$ 1.863,58		
6.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	491,71	R\$ 30,85	R\$ 15.169,25	491,71	0,00	491,71	R\$ 15.169,25	R\$ -	R\$ 15.169,25		
<b>Total do item</b>							<b>R\$ 17.032,83</b>				<b>R\$ 17.032,83</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 17.032,83</b>		
<b>7 PISOS</b>															
7.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	115,20	R\$ 16,98	R\$ 1.956,10	115,20	0,00	115,20	R\$ 1.956,10	R\$ -	R\$ 1.956,10		
7.2	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO.	M2	1512,77	R\$ 45,63	R\$ 69.027,70	1512,77	0,00	1512,77	R\$ 69.027,70	R\$ -	R\$ 69.027,70		
<b>Total do item</b>							<b>R\$ 70.983,80</b>				<b>R\$ 70.983,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 70.983,80</b>		
<b>8 FUNDAÇÃO</b>															
8.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 05/2021	M3	9,60	R\$ 540,85	R\$ 5.192,16	9,60	0,00	9,60	R\$ 5.192,16	R\$ -	R\$ 5.192,16		
<b>Total do item</b>							<b>R\$ 5.192,16</b>				<b>R\$ 5.192,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.192,16</b>		

  
 Marcos Aureo de Paula Reao  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 503.344.094-20


Avenida Camila de Lélis, 285 – Centro – Riacho da Cruz/RN – CEP 59.820-000 – CNPJ. 08.153.454/0001-04  
 Site: [www.riachodacruz.rn.gov.br](http://www.riachodacruz.rn.gov.br) - E-mail: [pmriachodacruz@gmail.com](mailto:pmriachodacruz@gmail.com) - Fone: (84) 3374-0002

  
 Zilton Pedro Menezes Marinho  
 Eng. Civil - CREA-RN Nº211554676-8  
 Matrícula Nº 120.620-6

MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN				BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 08									
Tomador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ</b>				Contrato de Prestação de Serviço Nº: <b>050101/2022</b>		Data: <b>05/01/2022</b>		Data emissão do BM <b>13/12/2022</b>		Período de referência <b>05.11.2022 a 13.12.2022</b>		Valor do Investimento <b>R\$ 470.321,35</b>	
Empresa Contratada <b>ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</b>				Objeto: <b>RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN</b>								Valor da Contrapartida <b>-</b>	
CNPJ <b>14.634.195/0001-36</b>				Endereço da Obra: <b>TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA</b>								Valor do CTEF <b>R\$ 54.889,32</b>	
Item	Código	Referência	Discriminação dos Serviços Contratados	CONTRATADO				EXECUTADO FÍSICO (Quantidades)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)		
				Unid.	Quantid.	P.Unit.	P.Total	Acumulado até a medição anterior	Medido neste período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido neste período	Acumulado incluindo o período
<b>9 SUPERESTRUTURA</b>													
9.1	92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18	M2	1595,80	R\$ 27,11	R\$ 43.262,14	1474,28	121,52	1595,80	R\$ 39.967,73	R\$ 3.294,41	R\$ 43.262,14
9.2	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	112,00	R\$ 42,48	R\$ 4.757,76	112,00	0,00	112,00	R\$ 4.757,76	R\$ -	R\$ 4.757,76
9.3	92785	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	5933,18	R\$ 15,21	R\$ 90.243,67	3988,39	1944,79	5933,18	R\$ 60.663,41	R\$ 29.580,26	R\$ 90.243,67
9.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	443,88	R\$ 13,77	R\$ 6.112,23	443,88	0,00	443,88	R\$ 6.112,23	R\$ -	R\$ 6.112,23
9.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	103,57	R\$ 18,33	R\$ 1.898,44	103,57	0,00	103,57	R\$ 1.898,44	R\$ -	R\$ 1.898,44
9.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	138,52	R\$ 446,83	R\$ 61.894,89	128,44	10,08	138,52	R\$ 57.390,84	R\$ 4.504,05	R\$ 61.894,89
9.7	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	138,52	R\$ 199,93	R\$ 27.694,30	128,44	10,08	138,52	R\$ 25.679,01	R\$ 2.015,29	R\$ 27.694,30
9.8	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016	M	1397,80	R\$ 59,30	R\$ 82.889,54	1229,30	168,50	1397,80	R\$ 72.897,49	R\$ 9.992,05	R\$ 82.889,54
<b>Total do item</b>							<b>R\$ 318.752,97</b>				<b>R\$ 269.366,91</b>	<b>R\$ 49.386,06</b>	<b>R\$ 318.752,97</b>
<b>10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>													
10.1	89849	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	8,00	R\$ 67,67	R\$ 541,36	0,00	8,00	8,00	R\$ -	R\$ 541,36	R\$ 541,36
10.2	10317	ORSE	GRELHA P/RALO EM PVC, REDONDA, 15CM, TIGRE OU SIMILAR	UND	100,00	R\$ 7,87	R\$ 787,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total do item</b>							<b>R\$ 1.328,36</b>				<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 541,36</b>	<b>R\$ 541,36</b>

  
**Marcos Aureo de Paiva Rêgo**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 503.344.094-70

Avenida Camila de Lélis, 285 – Centro – Riacho da Cruz/RN – CEP 59.820-000 – CNPJ. 08.153.454/0001-04  
 Site: [www.riachodacruz.rn.gov.br](http://www.riachodacruz.rn.gov.br) - E-mail: [pmriachodacruz@gmail.com](mailto:pmriachodacruz@gmail.com) - Fone: (84) 3374-0002

  
**Zilton Pedro Menezes Marinho**  
 Eng. Civil - CREA-RN Nº211554676-8  
 Matrícula Nº 120.620-6

MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN				BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 08										
Tomador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ</b>				Contrato de Prestação de Serviço Nº: <b>050101/2022</b>		Data: <b>05/01/2022</b>		Data emissão do BM <b>13/12/2022</b>		Período de referência <b>05.11.2022 a 13.12.2022</b>		Valor do Investimento <b>R\$ 470.321,35</b>		
Empresa Contratada <b>ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</b>				Objeto: <b>RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN</b>						Valor da Contrapartida <b>-</b>				
CNPJ <b>14.634.195/0001-36</b>				Endereço da Obra: <b>TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA</b>						Valor do CTEF <b>R\$ 54.889,32</b>				
Item	Código	Referência	Discriminação dos Serviços Contratados	CONTRATADO				EXECUTADO FÍSICO (Quantidades)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
				Unid.	Quantid.	P.Unit.	P.Total	Acumulado até a medição anterior	Medido neste período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido neste período	Acumulado incluindo o período	
<b>11</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>											
11.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	1512,77	R\$ 3,28	R\$ 4.961,89	0,00	1512,77	1512,77	R\$ -	R\$ 4.961,89	R\$ 4.961,89	
			<b>Total do item</b>				<b>R\$ 4.961,89</b>				<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.961,89</b>	<b>R\$ 4.961,89</b>	
			<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 470.321,35</b>				<b>R\$ 414.645,03</b>	<b>R\$ 54.889,32</b>	<b>R\$ 469.534,35</b>	
<b>TOTAIS EM R\$</b>								<b>R\$ 470.321,35</b>				<b>R\$ 414.645,03</b>	<b>R\$ 54.889,32</b>	<b>R\$ 469.534,35</b>
<b>TOTAIS EM %</b>												<b>88,16%</b>	<b>11,67%</b>	<b>99,83%</b>
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações que compõe e contratação executiva das obras, e foram executados de acordo com as normas técnicas.				Importa a presente medição o valor de R\$ 54.889,31 (Cinquenta e Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove reais e Trinta e Um Centavos).				carimbo e assinatura do Prefeito  <i>Marcos Aurélio de Paiva Rêgo</i> PREFEITO MUNICIPAL CPF 503.344.094-20			carimbo e assinatura do Engº. Fiscal  <i>Zilton Pedro Menezes Marinho</i> Engenheiro Civil CREA/RN: 2115546768 MATRICULA: 120620-6			
Observações:														

**OBJETO:** RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

**ENDEREÇO DA OBRA:** TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA

Pregão Presencial - PP Nº 008/2021 – Relatório Fotográfico da 8ª Medição – 05.11.2022 a 13.12.2022

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FIGURA 1 – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA;



FIGURA 2 – EXECUÇÃO DE FORMAS DE LAJES E VIGAMENTOS DO TRECHO ENTRE A RUA BEVENUTO ALVES DA ROCHA E A RUA VICENTE DAS CHAGAS DE OLIVEIRA

*Marcos Aurelio de Paula Reis*  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 503.744.094-70

*Alton Pedro Menezes Marinho*  
Engenheiro Civil  
CREA/RN: 2115546768  
MATRICULA: 120620-6

**OBJETO:** RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN


**ENDEREÇO DA OBRA:** TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA

Pregão Presencial - PP Nº 008/2021 – Relatório Fotográfico da 8ª Medição – 05.11.2022 a 13.12.2022

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**FIGURA 3 – EXECUÇÃO DE FORMAS E ARMAÇÃO DE LAJES E VIGAMENTOS DO TRECHO ENTRE A RUA BEVENUTO ALVES DA ROCHA E A RUA VICENTE DAS CHAGAS DE OLIVEIRA**

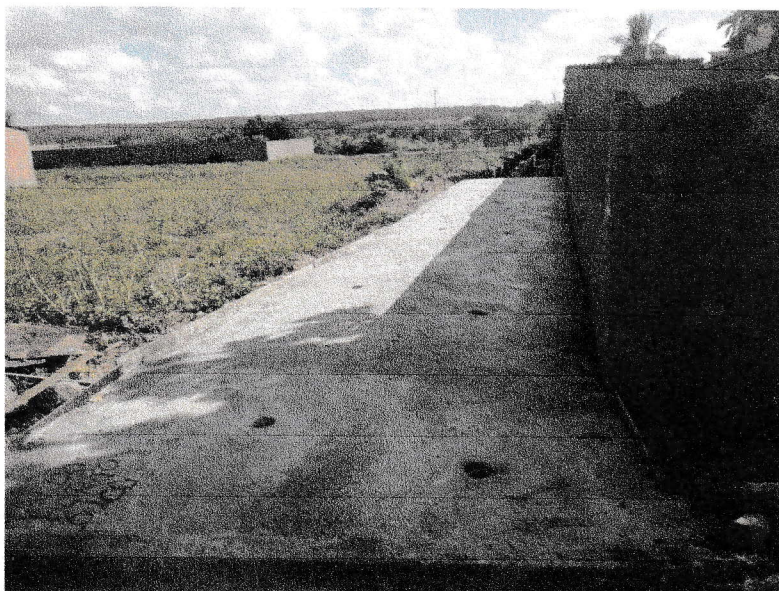

**FIGURA 4 – EXECUÇÃO DE FORMAS E ARMAÇÃO DE LAJES E VIGAMENTOS DO TRECHO ENTRE A RUA BEVENUTO ALVES DA ROCHA E A RUA VICENTE DAS CHAGAS DE OLIVEIRA**

*Marcos Aureo de Paiva Rêan*  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 503.344.094-75

*Altun Pedro Menezes Marinho*  
Engenheiro Civil  
CREAIRN: 2115346768  
MATRICULA: 120620-6

**OBJETO:** RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

**ENDEREÇO DA OBRA:** TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA

Pregão Presencial - PP Nº 008/2021 – Relatório Fotográfico da 8ª Medição – 05.11.2022 a 13.12.2022

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**FIGURA 5 – EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE LAJE E VIGAMENTOS DO TRECHO ENTRE A RUA BEVENUTO ALVES DA ROCHA E A RUA VICENTE DAS CHAGAS DE OLIVEIRA;**



**FIGURA 6 - SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DA OBRA – TRECHO ENTRE A RN – 177 E RUA PROFESSORA DALILA DA FONSECA ROCHA;**

*Alcides Almeida de Paiva Rêgo*  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 503.344.094-20

*Silton Pedro Menezes Marinho*  
Engenheiro Civil  
CREA/RN: 2115546768  
MATRICULA: 120620-6

**OBJETO:** RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

**ENDEREÇO DA OBRA:** TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA

Pregão Presencial - PP Nº 008/2021 – Relatório Fotográfico da 8ª Medição – 05.11.2022 a 13.12.2022

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**FIGURA 7 – SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DA OBRA – TRECHO ENTRE A RN – 177 E RUA PROFESSORA DALILA DA FONSECA ROCHA;**



**FIGURA 8 - SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DA OBRA - TRECHO ENTRE A RUA PROFESSORA DALILA DA FONSECA ROCHA E RUA 15 DE NOVEMBRO;**

*Marcos Aurelio de Paiva Reço*  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 503.344.094-20

*Cliton Pedro Menezes Marinho*  
Engenheiro Civil  
CREA/RN: 2115546768  
MATRÍCULA: 120620-6



**OBJETO:** RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

**ENDEREÇO DA OBRA:** TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA  
Pregão Presencial - PP Nº 008/2021 – Relatório Fotográfico da 8ª Medição – 05.11.2022 a 13.12.2022

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**FIGURA 9 – SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DA OBRA - TRECHO ENTRE A RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA 07 DE SETEMBRO;**



**FIGURA 10 - SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DA OBRA - TRECHO ENTRE A RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA 07 DE SETEMBRO;**

**Marcos Aurelio de Paiva Rego**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 503.344.094-70

**Wilton Pedro Menezes Marinho**  
Engenheiro Civil  
CREA/RN: 2115546768  
MATRICULA: 120620-6

**OBJETO:** RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

**ENDEREÇO DA OBRA:** TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA  
Pregão Presencial - PP Nº 008/2021 – Relatório Fotográfico da 8ª Medição – 05.11.2022 a 13.12.2022

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**FIGURA 11 – SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DA OBRA - TRECHO ENTRE A RUA 07 DE SETEMBRO E A RUA DELFINO FRANCISCO;**



**FIGURA 12 – SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DA OBRA - TRECHO ENTRE A RUA 07 DE SETEMBRO E A RUA DELFINO FRANCISCO;**

*Marcos Aurelio de Paiva Rêgo*  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF- 503.344.094-70


*Edilton Pedro Wenezes Marinho*  
Engenheiro Civil  
CREAIRN: 2115546768  
MATRICULA: 120620-6

**OBJETO:** RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN


**ENDEREÇO DA OBRA:** TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA

Pregão Presencial - PP N° 008/2021 – Relatório Fotográfico da 8ª Medição – 05.11.2022 a 13.12.2022

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

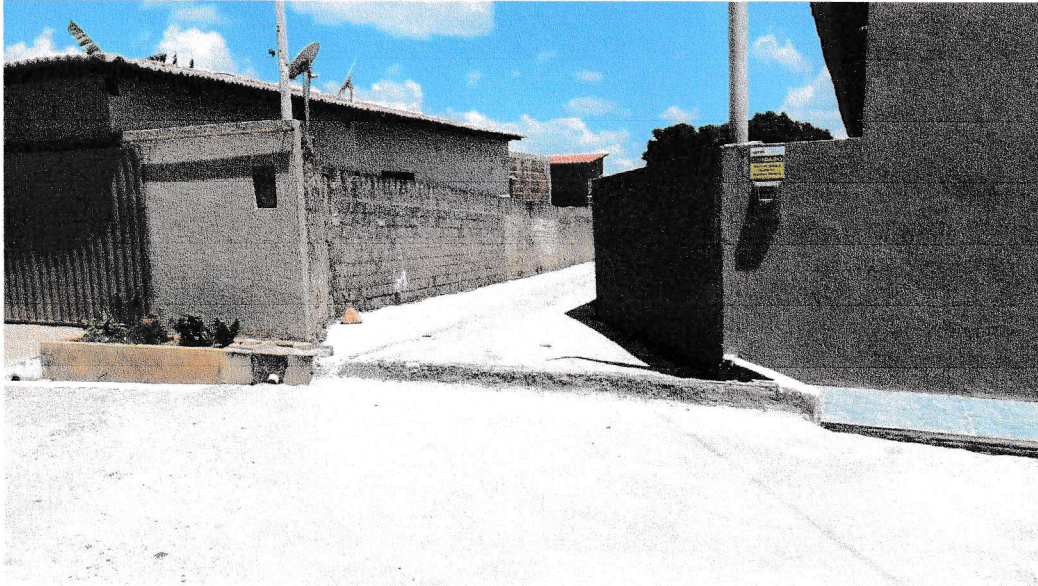

**FIGURA 13 – SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DA OBRA - TRECHO ENTRE A RUA DELFINO FRANCISCO E A RUA BEVENUTO ALVES DA ROCHA;**

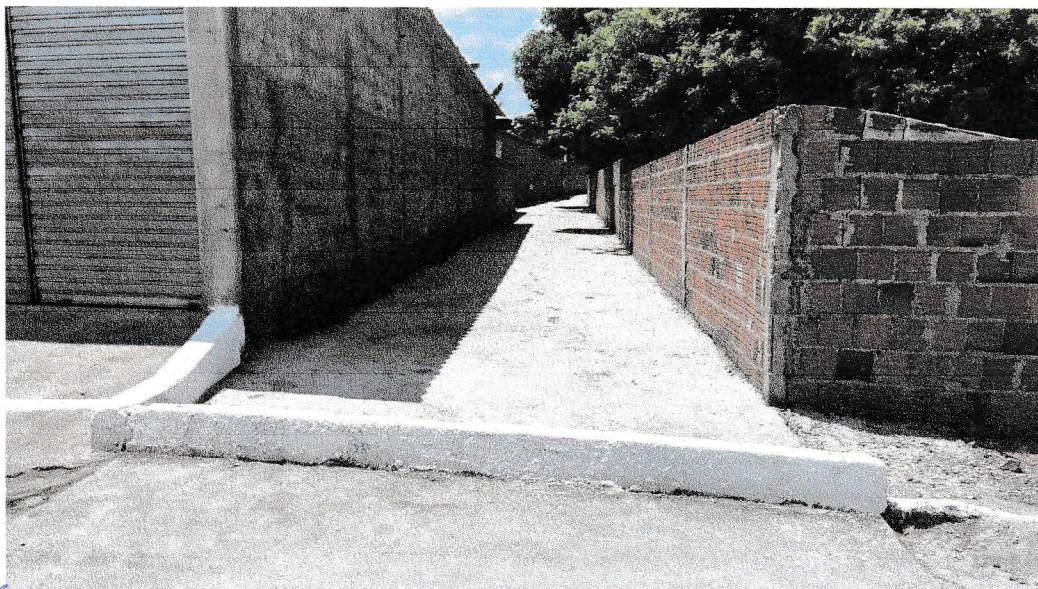

**FIGURA 14 – SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DA OBRA - TRECHO ENTRE A RUA DELFINO FRANCISCO E A RUA BEVENUTO ALVES DA ROCHA;**

*Marcos Aurelio de Paiva Rêgo*  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF- 503.344.094-20

*Wilson Pedro Menezes Marinho*  
Engenheiro Civil  
CREA/RN: 2115546768  
MATRICULA: 120620-6

**OBJETO:** RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

**ENDEREÇO DA OBRA:** TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA  
Pregão Presencial - PP Nº 008/2021 – Relatório Fotográfico da 8ª Medição – 05.11.2022 a 13.12.2022

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**FIGURA 15 – SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DA OBRA - TRECHO ENTRE A RUA BEVENUTO ALVES DA ROCHA E A RUA VICENTE DAS CHAGAS DE OLIVEIRA;**

*Marcos Aurelio de Paula Rego*  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 503.344.094-20

*Silton Pedro Menezes Marinho*  
Engenheiro Civil  
CREA/RN: 2115546768  
MATRICULA: 120620-6
